



Panorama Executivo

Prestação de contas - Coopere-br II (Sinergia)



COOPERERE-BR 2: Tração e Escala Acelerada



Maio/26

46

clientes na carteira

64.547 kWh

Energia Alocada



Junho/26

83

clientes na carteira

156.722 kWh

Energia Alocada



100%

Capacidade
Cadastrada
(157.000 kWh)

Ticket ainda está aberto na EDP
para valer o cadastro dos 83.



Embora 100% cadastrada, possuímos
~**30.000 kWh** realocáveis devido a clientes
com alocação superior ao consumo real.



Alerta Operacional: Fila de Cadastros EDP



Junho/26 - Submetido



40 novos cadastros submetidos à EDP no fechamento de junho.

Julho/26 - Em Processamento



Tickets encontram-se atualmente na fila de espera da distribuidora.

Agosto/Setembro - Reflexo Financeiro



O reflexo dos créditos de injeção na fatura dos novos clientes tem previsão realista para Agosto ou Setembro/26.

O crescimento está garantido no sistema, mas a esteira regulatória exige paciência no repasse dos créditos iniciais.

EXFISHES e o Enquadramento GD III



A Regra Regulatória

Dois Gatilhos para GD III:

1. Instalação individual absorvendo >25% da produção da usina.
2. Produção não ser 100% distribuída, com >25% permanecendo na unidade geradora.

(Ambos forçam o enquadramento de toda a usina como GD III).



O Caso Prático


Cenário Atual: Além do gatilho inicial da EXFISHES (80.000 kWh), **a necessidade de distribuir 100% da produção (evitando >25% na geradora) mantém o status de GD III.**

O ticket de junho visa resolver essa distribuição para desenquadrar.

Status Atual: O ticket de junho está em processamento na EDP para resolver a distribuição de 100% da produção e retirar o enquadramento GD III. A redistribuição já foi feita no sistema em junho.

Base anando en Slide C, o bar chart atualizado

COOPERE-BR 1 at rii 2

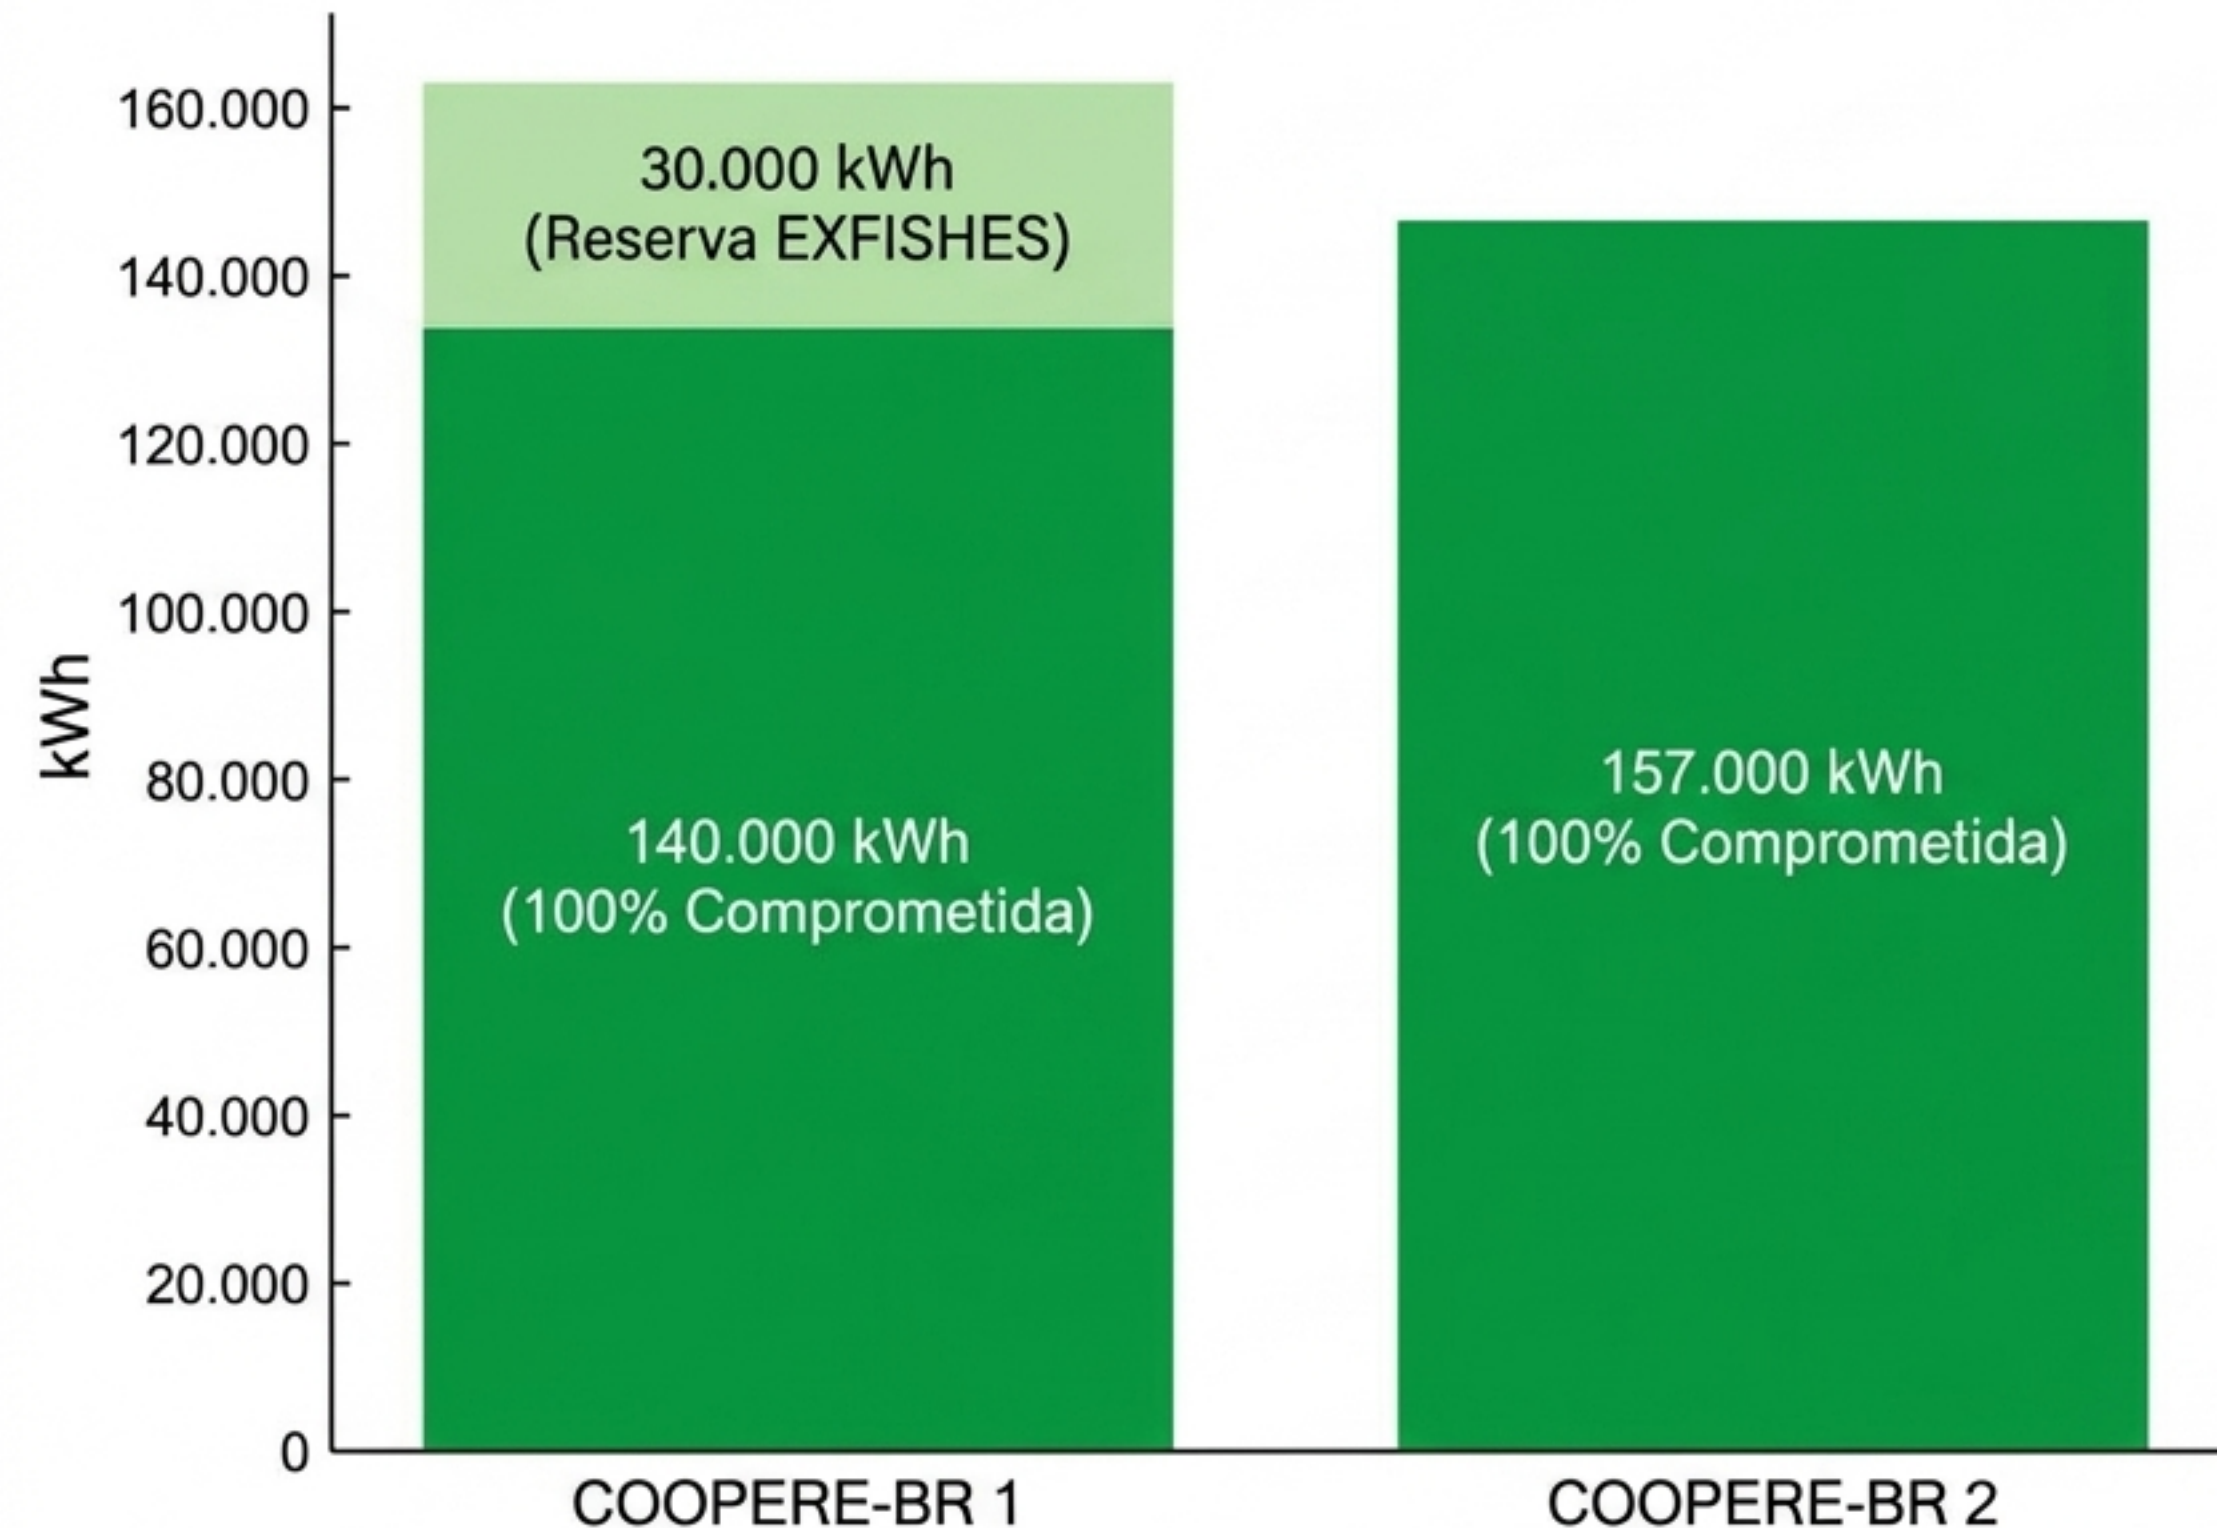

O Movimento Estratégico

30.000 kWh são mantidos como reserva estratégica na COOPERE-BR 1 para alocação futura (EXFISHES).

Ação Necessária

Gerenciar a reserva de 30.000 kWh na COOPERE-BR 1 para atender demandas futuras da EXFISHES.



Desobstrução Operacional: Portal EDP

Avanço significativo na resolução de gargalos locais.

Mais de 11 cadastros complexos resolvidos com sucesso diretamente com o time de suporte local da EDP. Ação proativa garantindo o fluxo da COOPERE-BR.



Atualização Administrativa: Integração Banestes

- ✓ O status de protesto não permanece mais ativo no sistema.

Teste de validação de fluxo de boletos em andamento
(Piloto: Conta Leonardo Rocha), visando estabilizar a malha
de cobrança da COOPERE-BR.

Sinergia: Inadimplência do Consórcio Legado

Passivo Legado (Valores Devidos) Total R\$ 99.061,30

- ✓ **Real Massas: R\$ 92.109,85**
(Advogada alinhando reunião)
- ✓ **Restaurante Aloha: R\$ 6.951,45**
(Em negociação / EDP desligando instalação)

Operação Atual e Reversões



A inadimplência da operação atual é ZERO.

- **Reversões ativas: Figatta** (~14.000 kWh recuperados, cobrança de 1ª indicação aplicada por ser cliente único)
- **Academia Hangar** (~20.000 kWh recuperados, sem cobrança de 1ª indicação).

Sinergia: Prazos EDP e Impacto na Base

O Cenário

A usina satélite possui geração média de ~94.000 kWh/mês com 43 clientes base.

O Atrito Regulatório

Alterações de titularidade/alocação na EDP levam de 60 a 90 dias para refletir na fatura.

O Impacto

O atraso deixou clientes 2 meses sem créditos, resultando na perda temporária de 10 clientes (~40.000 kWh).

A Lição para o Ecossistema

Movimentações de carteira (como o retorno da EXFISHES) devem ser **planejadas com 60 a 90 dias de antecedência** para blindar a percepção do cliente final.

SISGDSOLAR: O Motor do Ecossistema

Evoluímos para uma plataforma robusta, automatizada e monitorada de ponta a ponta, pronta para crescer com segurança.

Modernização

Automação

Suporte 24x7

